



COMUNE DI SANT'ARSENIO

OGGETTO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO DA ADIBIRE A MICRO NIDO - ASILO E SERVIZI INTEGRATIVI (CENTRO POLIFUNZIONALE PER FAMIGLIE) NEL COMUNE DI SANT'ARSENIO"

COMUNE DI SANT'ARSENIO (SA)

DESCRIZIONE DEI LAVORI:

ASILO NIDO E SERVIZI INTEGRATIVI (CENTRO POLIFUNZIONALE PER FAMIGLIE)



DIAGRAMMA DI ANTT

RUP:

Arch.Giovanni GUASTALEGNAME

PROGETTISTA:

Ing. Rossella LUPO



ELABORATO [SIC 03]

SCALA -

Sant'Arsenio, Maggio 2021

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ALLEGATO "A"

Comune di Sant'Arsenio
Provincia di SA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Ristrutturazione edilizia e messa in sicurezza mediante demolizione e ricostruzione di edificio da adibire a micro nido - asilo e servizi integrativi (Centro Polifunzionale per Famiglie) nel comune di Sant'Arsenio

COMMITTENTE: Comune di Sant'Arsenio.

CANTIERE: Via Florenzano, Sant'Arsenio (SA)

Sant'Arsenio, 12/05/2021


IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

per presa visione

IL COMMITTENTE

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO DA ADIBIRE A MICRO
_ NIDO NEL COMUNE DI SANT_ARSENIO_
DESCRIZIONE DEI LAVORI: ASILO NIDO E SERVIZI INTEGRATIVI (CENTRO POLIFUNZIONALE PER FAMIGLIE)

Nome attività	Durata	Giu2021Lug2021Ago2021Set2021Ott2021Nov2021Dic2021Gen2022Feb2022Mar2022																																															
		21/0628/0605/0712/0719/0726/0702/0809/0816/0823/0830/0806/0913/0920/0927/0904/1011/1018/1025/1001/1108/1115/1122/1129/1106/1213/1220/1227/1203/0110/0117/0124/0131/0107/0214/0221/0228/0207/03																																															
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	5 g																																																
Preparazione delle aree di cantiere	1 g																																																
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g																																																
Realizzazione della viabilità di cantiere	1 g																																																
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e a	1 g																																																
Apprestamenti del cantiere	3 g																																																
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat	1 g																																																
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g																																																
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g																																																
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1 g																																																
Impianti di servizio del cantiere	1 g																																																
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g																																																
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g																																																
RIMOZIONI	7 g																																																
Rimozione di apparecchi igienico sanitari	3 g																																																
Rimozione di impianti	4 g																																																
DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE	14 g																																																
DEMOLIZIONI	14 g																																																
Demolizione di interi fabbricati con mezzi meccanici	14 g																																																
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a	14 g																																																
SCAVO	8 g																																																
Scavo di spleamento	8 g																																																
FONDAZIONI	22 g																																																
Strutture in fondazione in c.a.	22 g																																																
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondaz	11 g																																																
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	11 g																																																
ELEVAZIONE	40 g																																																
Strutture in elevazione in c.a.	19 g																																																
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevaz	8 g																																																
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	11 g																																																
Solai in c.a.	21 g																																																
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o p	11 g																																																
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	10 g																																																
OPERE IN COPERTURA	25 g																																																

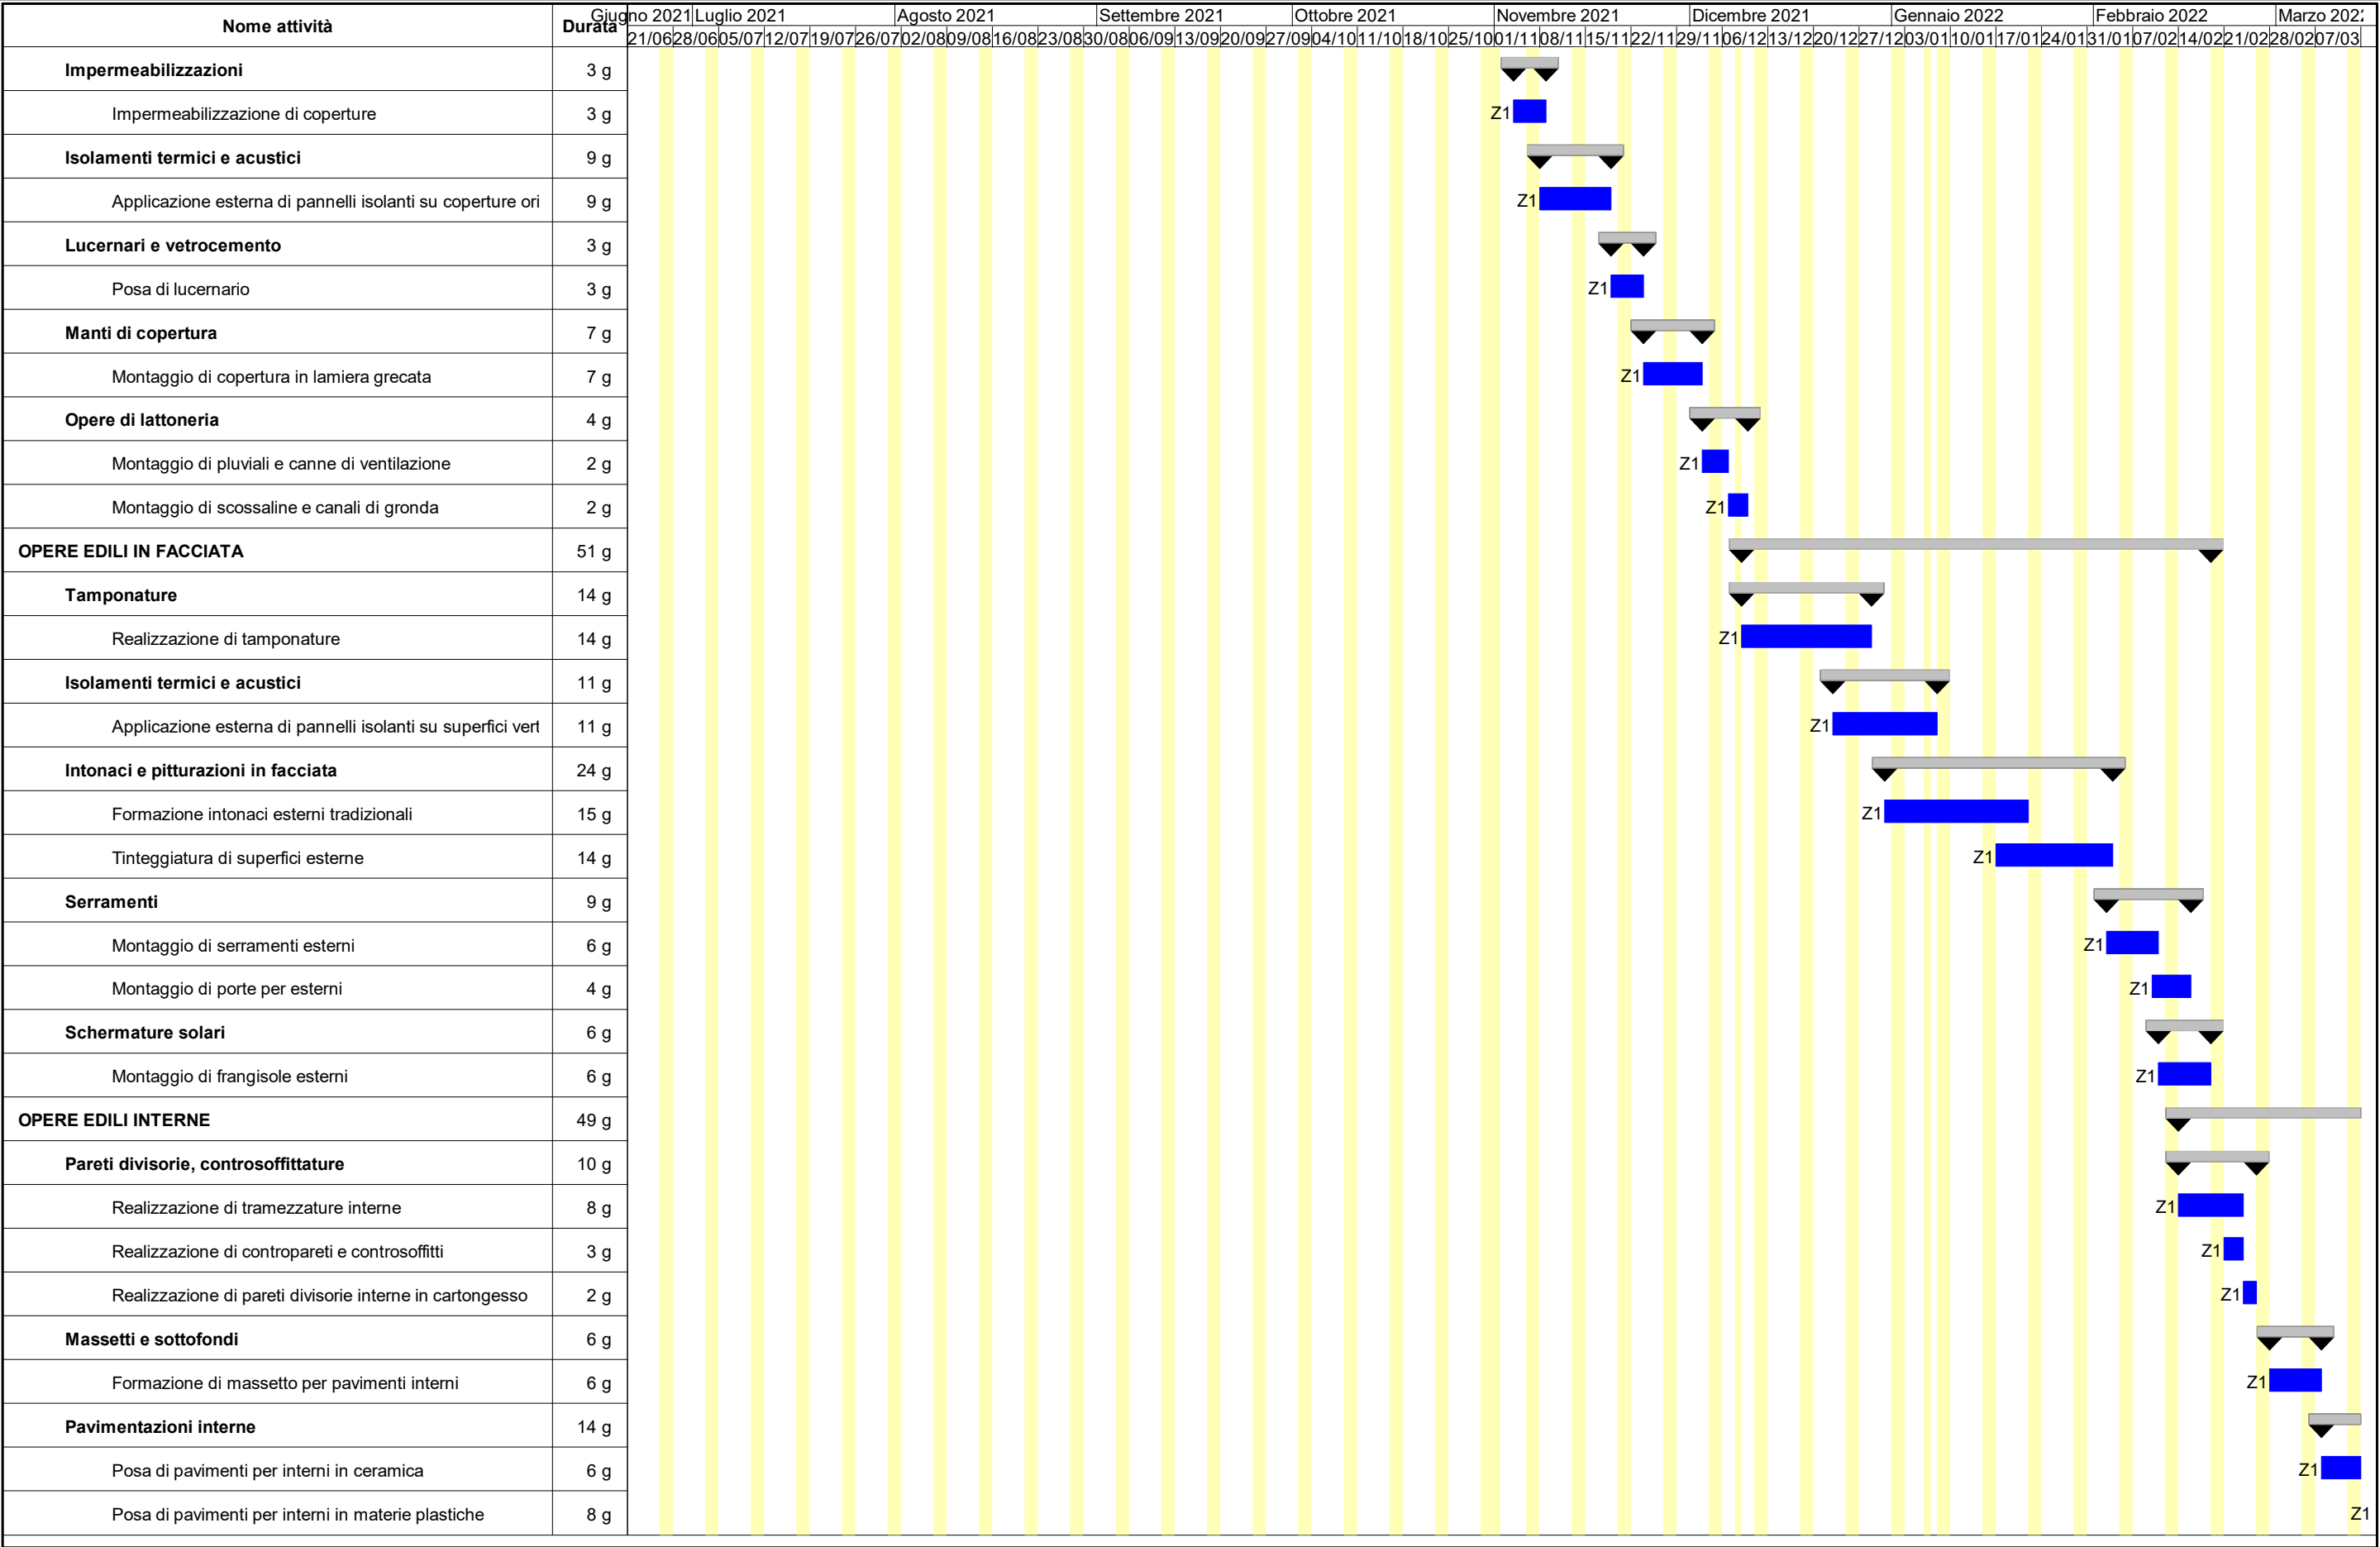

Nome attività	Durata	Giugno 2021	Luglio 2021	Agosto 2021	Settembre 2021	Ottobre 2021	Novembre 2021	Dicembre 2021	Gennaio 2022	Febbraio 2022	Marzo 2022																																	
		21/06	28/06	05/07	12/07	19/07	26/07	02/08	09/08	16/08	23/08	30/08	06/09	13/09	20/09	27/09	04/10	11/10	18/10	25/10	01/11	08/11	15/11	22/11	29/11	06/12	13/12	20/12	27/12	03/01	10/01	17/01	24/01	31/01	07/02	14/02	21/02	28/02	07/03					
Rivestimenti interni	5 g																																											
Posa di rivestimenti interni in ceramica	3 g																																											
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo	2 g																																											
Serramenti	5 g																																											
Montaggio di serramenti interni	5 g																																											
Intonaci e pitturazioni interne	40 g																																											
Formazione intonaci interni (tradizionali)	6 g																																											
Tinteggiatura di superfici interne	9 g																																											
IMPIANTI	64 g																																											
Impianti per la qualità dell'aria indoor	6 g																																											
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata	6 g																																											
Impianti termici	7 g																																											
Realizzazione della rete di distribuzione e posa impiantc	7 g																																											
Installazione della centrale termica per impianto termico	2 g																																											
Impianti elettrici	7 g																																											
Realizzazione di impianto elettrico	7 g																																											
Impianti antincendio	5 g																																											
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per im	5 g																																											
Impianti elevatori	3 g																																											
Realizzazione di impianto ascensore elettrico	3 g																																											
Impianti di sicurezza	4 g																																											
Realizzazione di impianto antintrusione	4 g																																											
Impianti idrico-sanitario	9 g																																											
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idric	6 g																																											
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	3 g																																											
Installazione della caldaia per produzione acqua calda s	2 g																																											
Impianto di illuminazione	5 g																																											
Installazione di corpi illuminanti	5 g																																											
Impianti solari fotovoltaici	8 g																																											
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	8 g																																											

Marzo 2022	Aprile 2022			Maggio 2022			Giugno 2022			Luglio 2022			Agosto 2022			Settembre 2022			Ottobre 2022			Novembre 2022			Dicembre 2022			Gennaio 2023			Febbraio 2023			Marzo 2023																	
14/03/22	21/03/22	28/03/22	04/04/22	11/04/22	18/04/22	25/04/22	02/05/22	09/05/22	16/05/22	23/05/22	30/05/22	06/06/22	13/06/22	20/06/22	27/06/22	04/07/22	11/07/22	18/07/22	25/07/22	01/08/22	08/08/22	15/08/22	22/08/22	29/08/22	05/09/22	12/09/22	19/09/22	26/09/22	03/10/22	10/10/22	17/10/22	24/10/22	31/10/22	07/11/22	14/11/22	21/11/22	28/11/22	05/12/22	12/12/22	19/12/22	26/12/22	02/01/23	09/01/23	16/01/23	23/01/23	30/01/23	06/02/23	13/02/23	20/02/23	27/02/23	06/03/23

